



Nordre Follo
kommune



Statusrapport Magasinparken Ungdomsskole

Magasinveien 31
Dato: 15.08.2023



Statusrapport for Magasinparken ungdomsskole


Prosjektet ligger på planen i forhold til planlagt fremdrift. Denne høsten vil bygget reise seg og man vil begynne å se konturene av ferdig resultat.

Prosjektet kobler nå vann og avløp til eksisterende anlegg utenfor tomten.

I Uke 34 vil hele bunnplaten støpes. I uke 36 vil vi starte med å montere to tårnkranter. Bæresystemet for bygget i massiv tre vil starte montasje i uke 38:

Planlagte kommende arbeider

- Støp av bunnplate uke 34.
- Montasje tårnkraner uke 36.
- Oppstart massivtre uke 38.

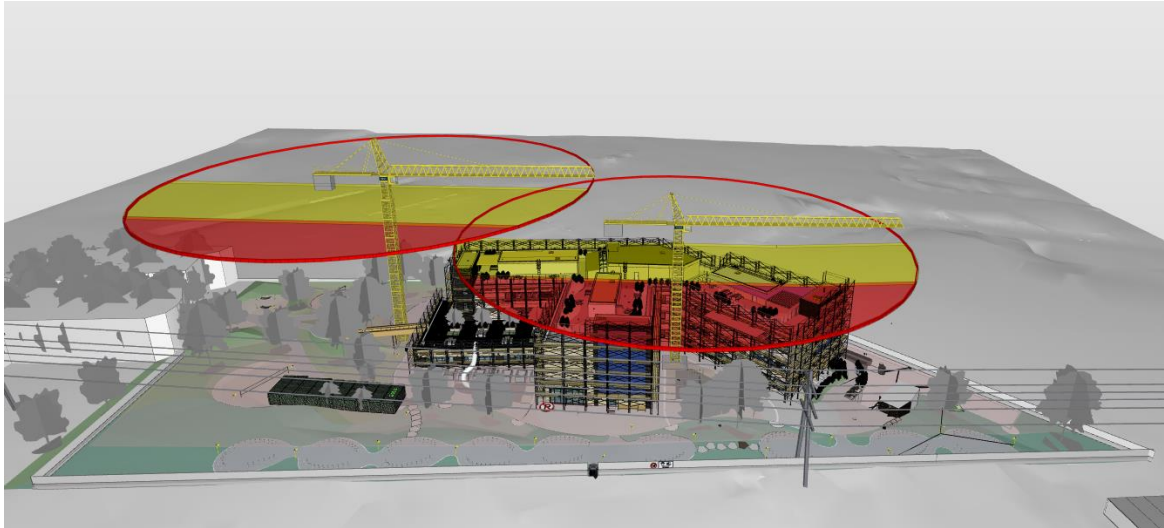

Tidspunkt for drift og støy

Vanlig drift på byggeplassen er normalt mellom kl 07:00 – 19:00 på hverdager.

I uke 34(mandag-torsdag) vil vi støpe dekke. Dette er en kontinuerlig prosess som antagelig vil pågå ut over kveldene.

Når vi monterer tårnkraner vil vi jobbe noe lengere enn planlagt i forhold til sikkerhet til høyspentkabelen.

Monteringen av bæresystemet vil foregå i 2 skift, som vil si at det vil være produksjon fra kl 07:00 - ca 22:00. Monteringen av bæresystemet er planlagt fram til starten av februar.

I utgangspunktet vil vi ikke jobbe lørdager. Men til info kan forekomme arbeid enkelte lørdager for å avslutte prosesser som er viktige for prosjektets fremdrift. I disse tilfellene vil vi hensynta at arbeider starter senere enn på normale hverdager, samt at arbeider som utføres ikke skal produsere vesentlig støy.

Støyende arbeider

Ingen spesielt støyende arbeider vil pågå i nær fremtid.

Høyspent

Se status for nedgravingen av høyspenten på kommunens nettside i linken under. Nedgravingen er ikke en del av skoleprosjektet.

<https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/2023/mai/status-for-nedgraving-av-hoyspentledning-gjennom-finstad---ski-vest/>

Har du spørsmål

Har du spørsmål eller innspill vedrørende arbeider på byggeplassen ta kontakt med byggeplassadministrasjonen. Vårt mål er å gjennomføre prosjektet på best mulig måte for alle.

Hovedbyggeleder fra Nordre Follo Kommune

Tomas Waag Helmeriksen

tomas.helmeriksen@advansia.no,

TLF: 91 72 42 18

Anleggsleder fra Entreprenør Hent AS

Helge Fristad

helge.fristad@hent.no

TLF : 91 78 01 71

Med vennlig hilsen

Rebecca Celine Høynes

Prosjektleder Nordre Follo kommune

rebecca.hoynes@nordrefollo.kommune.no

TLF: 47 62 90 63
